

BOMBAS SUMERGIBLES Y SERVICIOS
VALADEZ
 TEC. SALVADOR VALADEZ P.

8 de Febrero de 2021.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

Por medio de la presente, nos permitimos presentar a su consideración la siguiente cotización, de acuerdo a datos proporcionados:

POZO 84		
CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	MANIOBRA DE DESINSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE	\$ 5,000.00
1	MANIOBRA DE INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE	\$ 5,000.00
	SUBTOTAL	\$ 10,000.00
	16% I.V.A.	\$ 1,600.00
	TOTAL	\$ 11,600.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y SON L.A.B. IRAPUATO, GTO.

En espera de vernos favorecidos con su preferencia, nos despedimos deseándole un excelente día.

Atentamente

Salvador Valades

Embobinados Valades
 Ing. Salvador Valades Vela

JUPITER No. 1966 COL. VALLE DEL SOL C.P. 36590
TEL. 01 (462) 622 01 93 NEX. 169 12 20 I.D. 62*11*57421
E-MAIL: EMBOBINADOS_VALADES@HOTMAIL.COM



IRAPUATO

MEJOR CIUDAD

2018 - 2021

TARJETA INFORMATIVA


2 de febrero de 2021

TI-OMP-019


Departamento: Operación y Mantenimiento de Pozos

Asunto: Sustitución de equipo P-84

Por este medio se informa que se realizarán maniobras en el Pozo 84 Tabachines para sustitución de equipo de bombeo reparado para verificar su correcta operación y contar con un equipo de reserva en caso de ser necesario. Las maniobras se tienen programadas para realizarse el lunes 8 de Febrero del 2021 por lo que estará fuera de operación ese mismo día desde las 07:00 am hasta las 10:00 pm. Se estará suministrando el servicio con la operación del pozo 70 Las plazas y con pipas. Restableciéndose el servicio normal el día 9 de enero de 2021.


OMAR JUAREZ PADILLA
OPERACIÓN Y MTTO DE POZOS




ING ROGELIO DANIEL LIÑAN ARTEAGA
JEFE DE OPERACIÓN Y MTTO DE POZOS





IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2018 - 2021

TARJETA INFORMATIVA

08 de febrero del 2021

TI-OMP-32

Departamento: Operación y Mantenimiento de Pozos

Asunto: Maniobra DESINSTALACION e INSTALACION equipo de bombeo.


Por este medio se informa que el 08 de febrero del presente se realiza maniobra en el pozo 84 ubicado en TABACHINES atendiendo el folio 0002758013.

Desinstalación Inicio 08:00 am y termino 13:00

El 08 de febrero del presente se empieza la desinstalación con el proveedor VALADES VELA SALVADOR.

Se desinstala equipo de bombeo siendo lo siguiente:

- 1-Bomba sumergible marca GABRIEL modelo 5 pasos
- 1-Motor sumergible marca GABRIEL CAPACIDAD 200 HP SERIE 1471510045
- 21-Tramos de columna de 08 " x 6.01 Mts
- 130 Mts de cable sumergible cal. 3/0 AWG en Paralelo

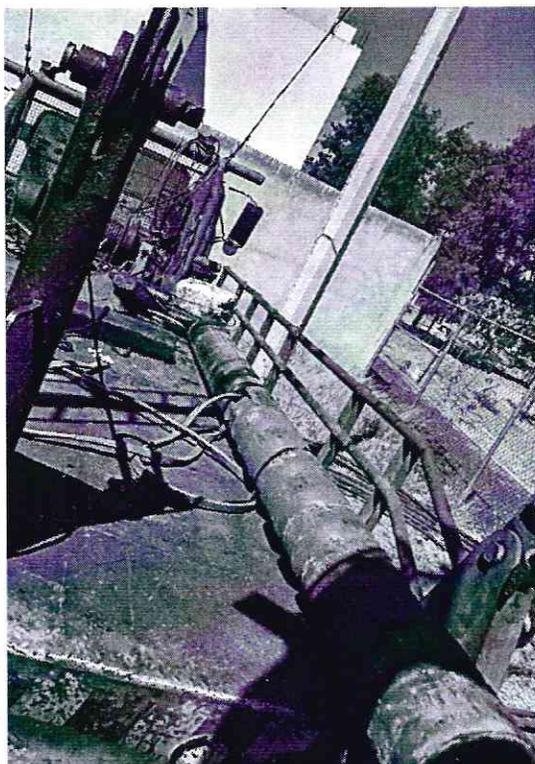



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2018 - 2021

08 de febrero de 2021

TI-OMP-32

Departamento: Operación y Mantenimiento de Pozos

Asunto: Maniobra DESINSTALACION e INSTALACION equipo de bombeo

Instalación Inicio 13:00 y termino 21 hrs

El 8 de Febrero del presente se empieza la instalación con el proveedor VALADES VELA SALVADOR. Con equipo de bombeo reparado


Equipo de bombeo siendo lo siguiente:

- Bomba sumergible marca INDAR modelo UGP-1020-05 serie IA 108516
- Motor sumergible marca INDAR modelo ML-25-3/080 capacidad 100 HP SERIE IA 108516
- 21-Tramos de columna de 08 " x 6.01 Mts
- 130 Mts de cable sumergible cal. 3/0 AWG en Paralelo



Sin más por el momento cualquier duda o aclaración quedo a sus órdenes


OMAR JUAREZ PADILLA
OPERACIÓN Y MTTO DE POZOS


ING ROGELIO DANIEL LIÑAN ARTEAGA
JEFE DE OPERACIÓN Y MTTO DE POZOS

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia

Tel. 01 (426) 606 91 00 Irapuato, Gto. México

www.japami.gob.mx



BOMBAS SUMERGIBLES Y SERVICIOS

VALADEZ

TEC. SALVADOR VALADEZ P.

10 de Febrero de 2021.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

Por medio de la presente, nos permitimos presentar a su consideración la siguiente cotización, de acuerdo a datos proporcionados:

POZO 110		
CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	MANIOBRA DE DESINSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE	\$ 5,000.00
1	MANIOBRA DE INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE	\$ 5,000.00
	SUBTOTAL	\$ 10,000.00
	16% I.V.A.	\$ 1,600.00
	TOTAL	\$ 11,600.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y SON L.A.B. IRAPUATO, GTO.

En espera de vernos favorecidos con su preferencia, nos despedimos deseándole un excelente día.

Atentamente



Embobinados Valades
Ing. Salvador Valades Vela

JUPITER No. 1966 COL. VALLE DEL SOL C.P. 36590
TEL. 01 (462) 622 01 93 NEX. 169 12 20 I.D. 62*11*57421
E-MAIL: EMBOBINADOSVALADES@HOTMAIL.COM



IRAPUATO

MEJOR CIUDAD

2018 - 2021

TARJETA INFORMATIVA

08 de Febrero del 2021

TI-OMP-024

Departamento: Operación y Mantenimiento de Pozos

Asunto: DESINSTALACION POZO 110

Por este medio se informa que se tiene una falla intermitente en el equipo de bombeo del pozo 110 de la colonia Apatzingán, lo que provoca que el equipo quede fuera de operación, por lo que se realizó una revisión general de las instalaciones electromecánicas, concluyendo que la falla se encuentra en el último tramo de conducción al motor, por lo que es necesario desinstalar el equipo de bombeo, y revisar si en el tramo del cable sumergible se encuentra algún daño que pueda estar provocando la falla.

Se propone desinstalar el equipo el miércoles 10 de febrero diagnosticando la falla ese mismo día quedando restablecido el servicio el 11 de febrero del presente.

Sin más por el momento quedo para cualquier duda o aclaración.



OMAR JUAREZ PADILLA
OPERACIÓN Y MTTTO DE POZOS

No De
y

Vo. Bo.
Rogelio Daniel Liñan Arteaga
Jef. Oper. y Mttto

ING ROGELIO DANIEL LIÑAN ARTEAGA
JEFE DE OPERACION Y MTTTO DE POZOS





IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2018 - 2021

TARJETA INFORMATIVA

17 de febrero 2021


TI-OMP-072

Departamento: Operación y Mantenimiento de Pozos

Asunto: Re-equipamiento P-110

Por este medio se informa que derivado de los trabajos de re-equipamiento equipo de bombeo dañado realizados el 10 de febrero de 2021 en pozo 110 Materno infantil se informa que el equipo desinstalado es el siguiente:

- 1 Bomba Sumergible Marca LUBI Mod.W125/6 acoplada a
- 1 Motor Sumergible Marca Gabriel de 125 HP. Con No. Serie 9212071836
- 24 Tramos de Tubo de 8" x 6.10 mts.
- 150 Mts. de Cable Sumergible Cal. 3 x 3/0
- 150 Mts. de Manguera P/Sondeo de 1"

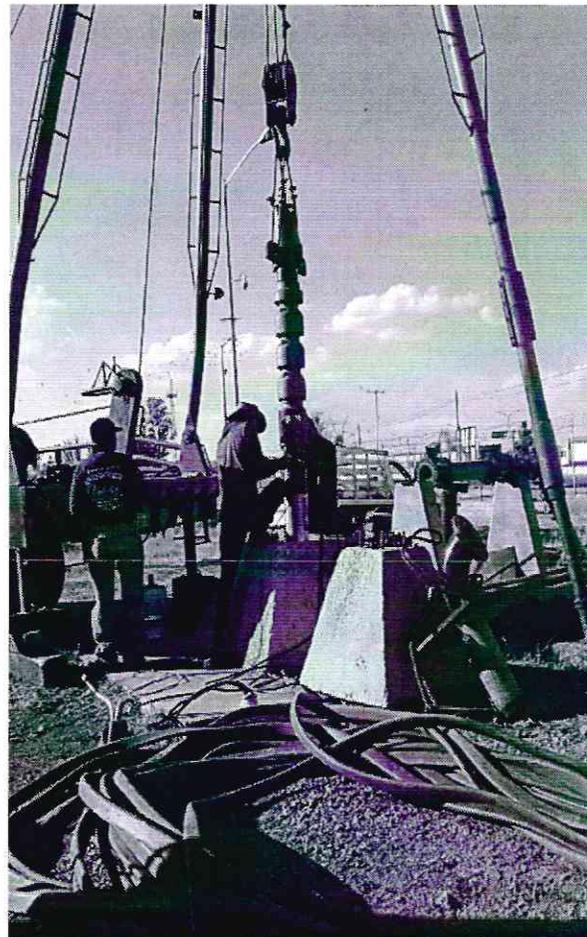



IRAPUATO

MEJOR CIUDAD

2018 - 2021

TARJETA INFORMATIVA

17 de febrero 2021

TI-OMP-072



Departamento: Operación y Mantenimiento de Pozos

Asunto: Re-equipamiento P-110

Por este medio se informa que se realizó instalación 10 de febrero del presente equipo de bombeo NUEVO en el pozo 110 ubicado en materno infantil

Se prolongó maniobra de instalación 3 hrs mas terminando a las 02:00 am

- 1 Bomba Sumergible Marca GOULDS modelo: 9RCLC/3SUM6-8N N° B092
- 1 Motor Sumergible Marca SME USA modelo: 8SME 1000-2 4C-60-D 100 HP N°00042006178 (NUEVO)
- 24 Tramos de Tubo de 8" x 6.10 mts.
- 150 Mts. de Cable Sumergible Cal. 3 x 3/0
- 150 Mts. de Manguera P/Sondeo de 1"

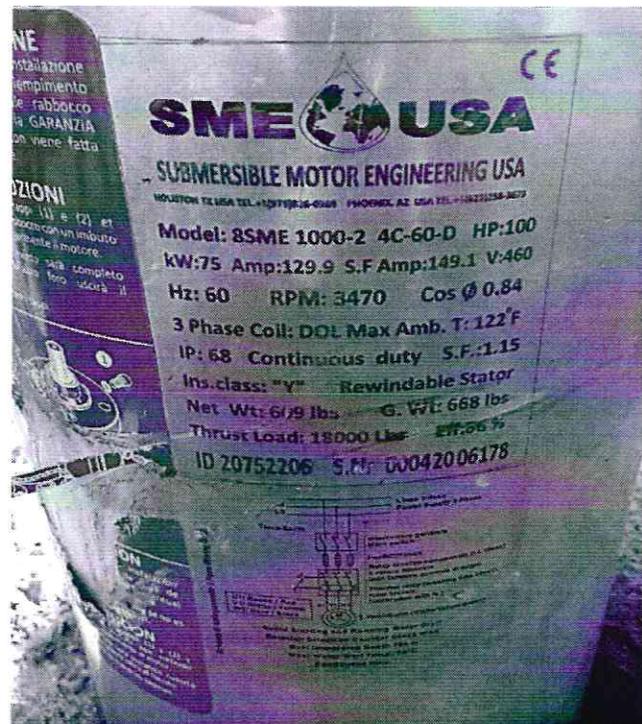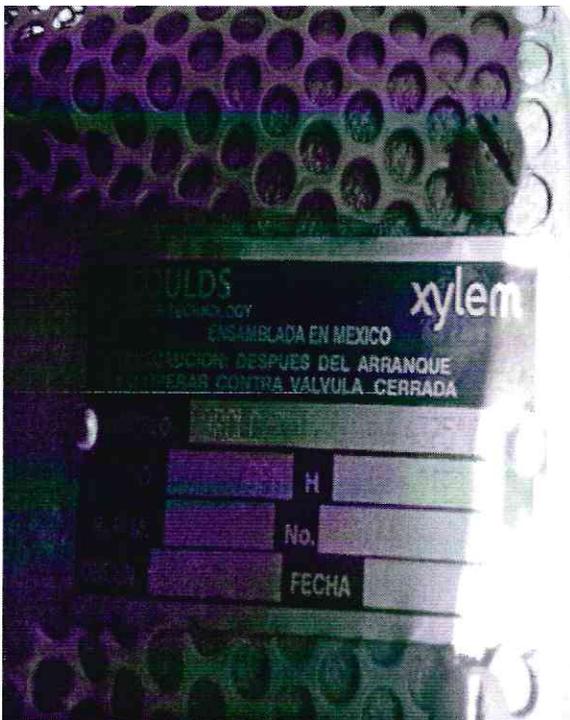



IRAPUATO

MEJOR CIUDAD

2018 - 2021



OMAR JUAREZ PADILLA
OPERACIÓN Y MTTTO DE POZOS

ING ROGELIO DANIEL LIÑAN ARTEAGA
JEFE DE OPERACIÓN Y MTTTO DE POZOS



BOMBAS SUMERGIBLES Y SERVICIOS

VALADEZ

TEC. SALVADOR VALADEZ P.

13 de Febrero de 2021.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

Por medio de la presente, nos permitimos presentar a su consideración la siguiente cotización, de acuerdo a datos proporcionados:

POZO 58		
CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	MANIOBRA DE DESINSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE	\$ 7,500.00
		16% I.V.A. \$ 1,200.00
		TOTAL \$ 8,700.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y SON L.A.B. IRAPUATO, GTO.

En espera de vernos favorecidos con su preferencia, nos despedimos deseándole un excelente día.

Atentamente



Embobinados Valades
Ing. Salvador Valades Vela

JUPITER No. 1966 COL. VALLE DEL SOL C.P. 36590
TEL. 01 (462) 622 01 93 NEX. 169 12 20 I.D. 62*11*57421
E-MAIL: EMBOBINADOS VALADES@HOTMAIL.COM



TARJETA INFORMATIVA

14 de febrero del 2021

TI-OMP-67

Departamento: Operación y Mantenimiento de Pozos

Asunto: Maniobra DESINSTALACION e INSTALACION equipo de bombeo.


Por este medio se informa que el 13 de febrero del presente se realiza maniobra en el pozo 58 ubicado en parque hidalgo atendiendo el folio 0002758020 Equipo de bombeo sumergible dañado

Desinstalación Inicio 13:00hrs y termino 20:00 hrs

El 13 de febrero del presente se empieza la desinstalación con el proveedor VALADEZ

Se desinstala equipo de bombeo siendo lo siguiente:

- 1 Bomba sumergible INDAR MODELO UGP-1010-05
- 1 Motor sumergible marca INDAR N° IA 105816

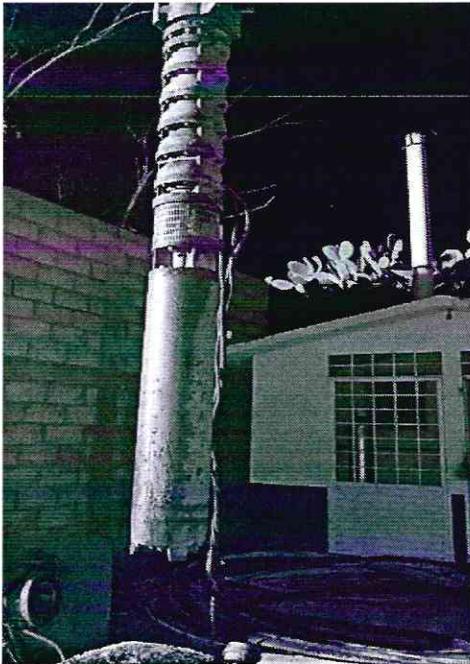


OMAR JUÁREZ PADILLA
OPERACIÓN Y MITTO DE POZOS


ING ROGELIO DANIEL LIÑAN ARTEAGA
JEFE DE OPERACIÓN Y MITTO DE POZOS

BOMBAS SUMERGIBLES Y SERVICIOS

VALADEZ

TEC. SALVADOR VALADEZ P.

19 de Febrero de 2021.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.


Por medio de la presente, nos permitimos presentar a su consideración la siguiente cotización, de acuerdo a datos proporcionados:

POZO 89		
CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	MANIOBRA DE DESINSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE	\$ 5,000.00
1	MANIOBRA DE INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE	\$ 5,000.00
	SUBTOTAL	\$ 10,000.00
	16% I.V.A.	\$ 1,600.00
	TOTAL	\$ 11,600.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y SON L.A.B. IRAPUATO, GTO.

En espera de vernos favorecidos con su preferencia, nos despedimos deseándole un excelente día.

Atentamente



Embobinados Valades
Ing. Salvador Valades Vela

JUPITER No. 1966 COL. VALLE DEL SOL C.P. 36590
TEL. 01 (462) 622 01 93 NEX. 169 12 20 I.D. 62*11*57421
E-MAIL: EMBOBINADOS VALADES@HOTMAIL.COM



IRAPUATO

MEJOR CIUDAD

2018 - 2021

TARJETA INFORMATIVA

22 de febrero de 2021

TI-OMP-056

Departamento: Operación y Mantenimiento de Pozos

Asunto: Maniobras de desinstalación P-89

Por este medio se informa que el 19 de febrero de 2021 se revisó operación de equipo de bombeo del pozo 89 Floresta ya que se reportó falta de agua en la zona. Derivado de esta revisión se determina que existe daño interno en motor y no es posible arrancarlo en esa condición siendo necesario realizar maniobra de desinstalación. Se le llama al proveedor Salvador Valadez para desinstalar el equipo, y se saca de almacén equipo de bombeo a fin de realizar también la maniobra de instalación y dejar operando el equipo de bombeo.

El equipo desinstalado es el siguiente:

- Bomba sumergible marca Goulds 9RCLC/3 sin placa de datos
- Motor sumergible de 100 hp 460 V sin placa de datos
- 18 tramos de tubería de 6" x 6.1 siendo 110 m de columna
- 110 m de cable sumergible 3 x 1/0

El equipo instalado:

- Bomba KSB UPA200080/06GB SERIE KSB2010540101 30 lps 150 mca
- Motor KSB UMA200-65/21GD SERIE KSB2010540101 89 HP 460 V
- 18 tramos de tubería de 6" x 6.1 siendo 110 m de columna
- 110 m de cable sumergible 3 x 1/0

El equipo queda operando el mismo día con un gasto de 34.5 lps

OMAR JUÁREZ PADILLA
OPERACIÓN Y MTO DE POZOS

ING ROGELIO DANIEL LIÑAN ARTEAGA
JEFE DE OPERACIÓN Y MTO DE POZOS



IRAPUATO

MEJOR CIUDAD

2018 - 2021

TARJETA INFORMATIVA

22 de febrero de 2021

TI-OMP-056


Departamento: Operación y Mantenimiento de Pozos

Asunto: Maniobras de desinstalación P-89

El equipo instalado:

- Bomba KSB UPA200080/06GB SERIE KSB2010540101 30 lps 150 mca
- Motor KSB UMA200-65/21GD SERIE KSB2010540101 89 HP 460 V
- 18 tramos de tubería de 6" x 6.1 siendo 110 m de columna
- 110 m de cable sumergible 3 x 1/0

El equipo queda operando el mismo día con un gasto de 34.5 lps

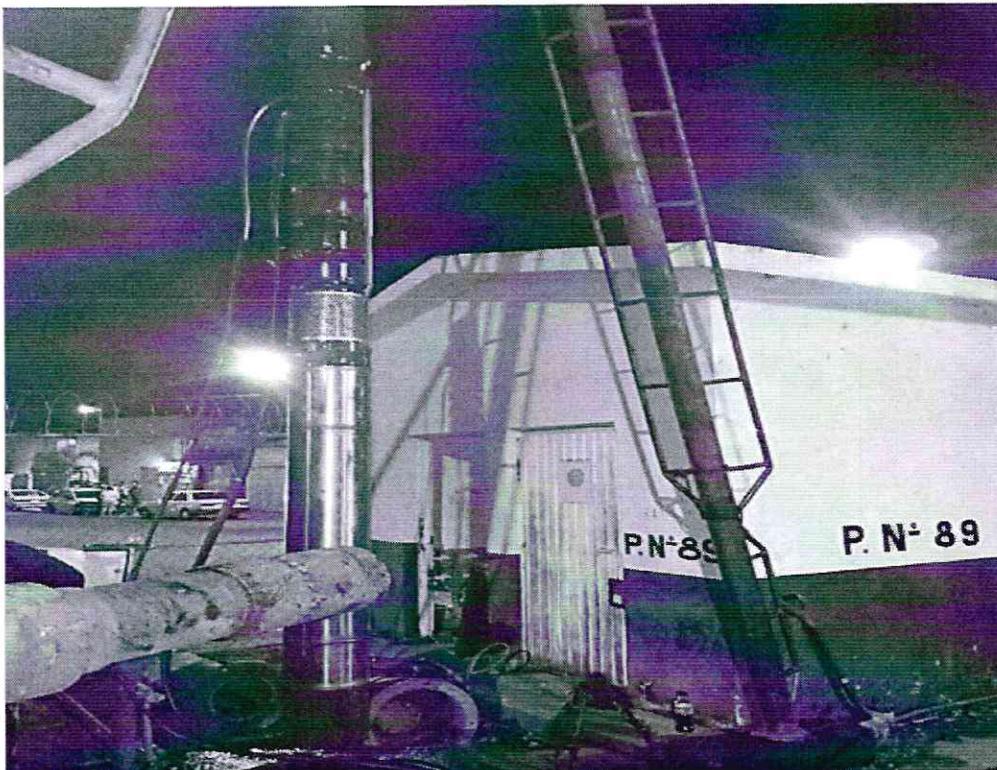

OMAR JUAREZ PADILLA
OPERACIÓN Y MITTO DE POZOS

ING ROGELIO DANIEL LIÑAN ARTEAGA
JEFE DE OPERACIÓN Y MITTO DE POZOS



IRAPUATO

MEJOR CIUDAD

2018 - 2021

TARJETA INFORMATIVA

22 de febrero de 2021

TI-OMP-056

Departamento: Operación y Mantenimiento de Pozos

Asunto: Maniobras de desinstalación P-89

Por este medio se informa que el 19 de febrero de 2021 se revisó operación de equipo de bombeo del pozo 89 Floresta ya que se reportó falta de agua en la zona. Derivado de esta revisión se determina que existe daño interno en motor y no es posible arrancarlo en esa condición siendo necesario realizar maniobra de desinstalación. Se le llama al proveedor Salvador Valadez para desinstalar el equipo, y se saca de almacén equipo de bombeo a fin de realizar también la maniobra de instalación y dejar operando el equipo de bombeo.

El equipo desinstalado es el siguiente:

- Bomba sumergible marca Goulds 9RCLC/3 sin placa de datos
- Motor sumergible de 100 hp 460 V sin placa de datos
- 18 tramos de tubería de 6" x 6.1 siendo 110 m de columna
- 110 m de cable sumergible 3 x 1/0

